

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL'ARTE
Rilasciata al committente dall'impresa installatrice
(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)**

Il sottoscritto **ERNESTO CATASTA** titolare dell'impresa individuale **CATASTA ERNESTO** operante nel settore networking e telecomunicazioni con sede in via **Ugo Foscolo 11, Cupra Marittima (AP)** tel. **3488121939**, part. IVA 02199080447

o iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di **Ascoli Piceno** n. **CTSRST68T08H769J**

o iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di **Ascoli Piceno** n. **74489** esecutrice dell'impianto **Cablaggio strutturato completo di apparati attivi WIFI**

inteso come:

☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: **Around People srl**

installato nei locali siti nel comune di Civitanova Marche (MC) presso:

SCUOLA INFANZIA "L. Bartolini", Via Quattro Marine 7

SCUOLA INFANZIA "C. Collodi", Via Saragat 5/A

SCUOLA INFANZIA "A. Giuliani", Via Regina Elena 3

SCUOLA INFANZIA "G. Rodari", Via Bragadin 5

SCUOLA PRIMARIA "D. Alighieri", Via Regina Elena 5

SCUOLA PRIMARIA "San G. Bosco", Via Saragat 7

SCUOLA PRIMARIA "Don L. Milani", Via De Pinedo 6

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "L. Pirandello", Via Saragat 50

in edifici adibito ad uso:

☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da Paolo Polverigiani;
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (allegato Relazione Tipologica);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito
- le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7;
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- schema di impianto realizzato;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Macerata, 10 dicembre 2022

Il responsabile tecnico

CATASTA ERNESTO

Via U. Foscolo, 11

63064 CUPRA MARITTIMA (AP)

C. Fisc.: CTS RST 68T08 H769J

Part.IVA: 02199080447

Il dichiarante

CATASTA ERNESTO

Via U. Foscolo, 11

63064 CUPRA MARITTIMA (AP)

C. Fisc.: CTS RST 68T08 H769J

Part.IVA: 02199080447

TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI - Fornitura in opera Cablaggio strutturato completo di apparati attivi WIFI

Allegato alla dichiarazione di conformità

Allegato obbligatorio alla dichiarazione di conformità (D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008) relativo alla fornitura in opera di un Cablaggio strutturato completo di apparati Attivi WiFi presso Istituto Comprensivo Via Regina Elena, Civitanova Marche (MC).

Commissionato da: **Around People srl**

Impresa esecutrice dei lavori: **Ernesto Catasta, impresa individuale**

DICHIARA

Che il materiale di seguito elencato è conforme a quanto prescritto dall'art. 5-6 del D.L. 37/08 ed alle norme CEI applicabili e vigenti alla data di installazione:

DESCRIZIONE MATERIALI COME DA ODA 6814033 del 17.05.2022

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Quantità
EAP615-Wall	Access Point TP-Link EAP615-Wall Indoor AP 1750 Mbps Dual Band 2x2 MU-MIMO. 802.11a/b/ g/n/ac/ax	90
TL-SG2428P	Switch PoE TL-SG2428P Switch Manageable L2 24x1Gbps Eth + 4 SFP completi di moduli SFP	7
TL-SG2210MP	Switch PoE TL-SG2210MP Switch Manageable L2 8Port 150W Gigabit Smart Switch + 2 SFP PoE+ Omada	3
OC200	Omada Hardware Controller Gestione centralizzata Hybrid Cloud	8
RB4011IGS+RM	Gateway Mikrotik RB4011IGS+RM Firewall, captive portal, web filter	8
DUHM-0002624	Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	1525 m
ICOC U6-6U-010	Cavo di rete Patch in Rame Cat. 6 Grigio UTP 1 mt	124
CAMA503	Scatole tipo UNI503 da esterno, complete di modulo con 1 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice	85
UPS-Keor	UPS-KEOR PDU 800VA 8 SCH potenza nominale: 800 VA, potenza attiva nominale: 480 W 8 prese di uscita Schuko CEE7/3	2
CASE EW-2006GL	Armadio Rack 19" a muro 6 unità sezione unica prof.450mm, completi di accessori	9

Il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente di installazione.

Macerata, 10 dicembre 2022

Ernesto Catasta

CATASTA ERNESTO
Via U. Foscolo, 11
63064 CUPRA MARITTIMA (AP)
C. Fisc.: CTS RS168T08 N769J
Part.IVA: 02199080447


Around People srl
AroundPeople srl
tel 0733 291184
Via Roma 131 C. 62100 Macerata (MC)
P.Iva 02017060431 C.S.D. M5UXCR1
info@pec.aroundpeople.it

SCHEMA IMPIANTO REALIZZATO


Allegato alla dichiarazione di conformità

SEDE SEGRETERIA


**CIRCOLO DIDATTICO REGINA ELENA
PLESSO D. ALIGHIERI
Pad. A primo piano**

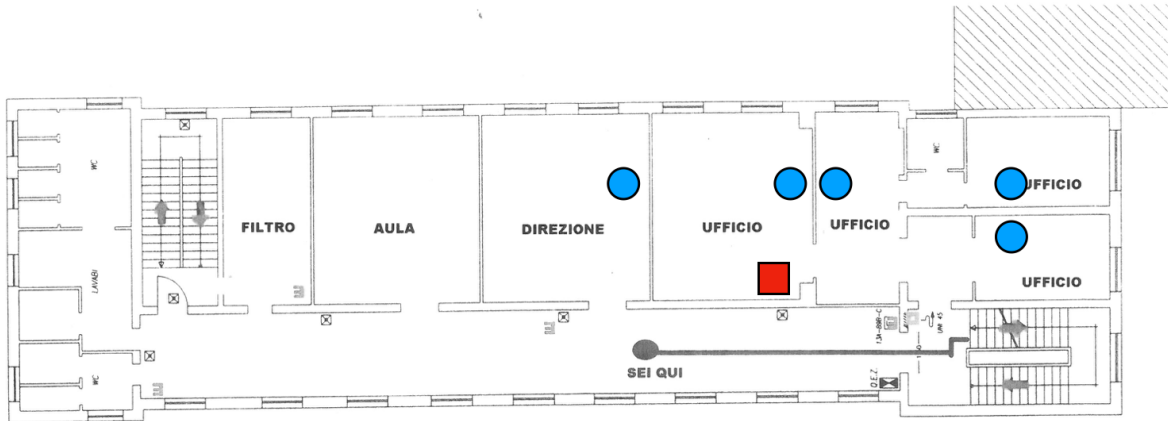


SECONDARIA PIRANDELLO

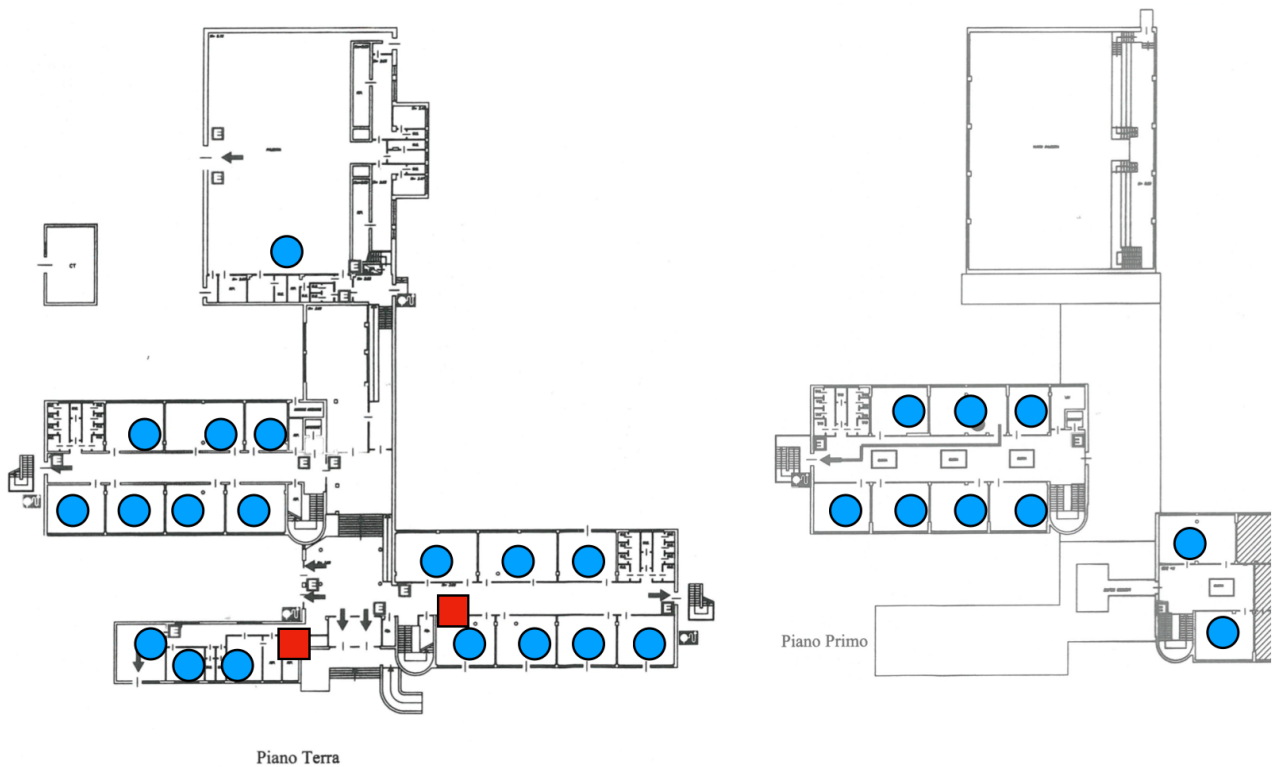


INFANZIA A.GIULIANI

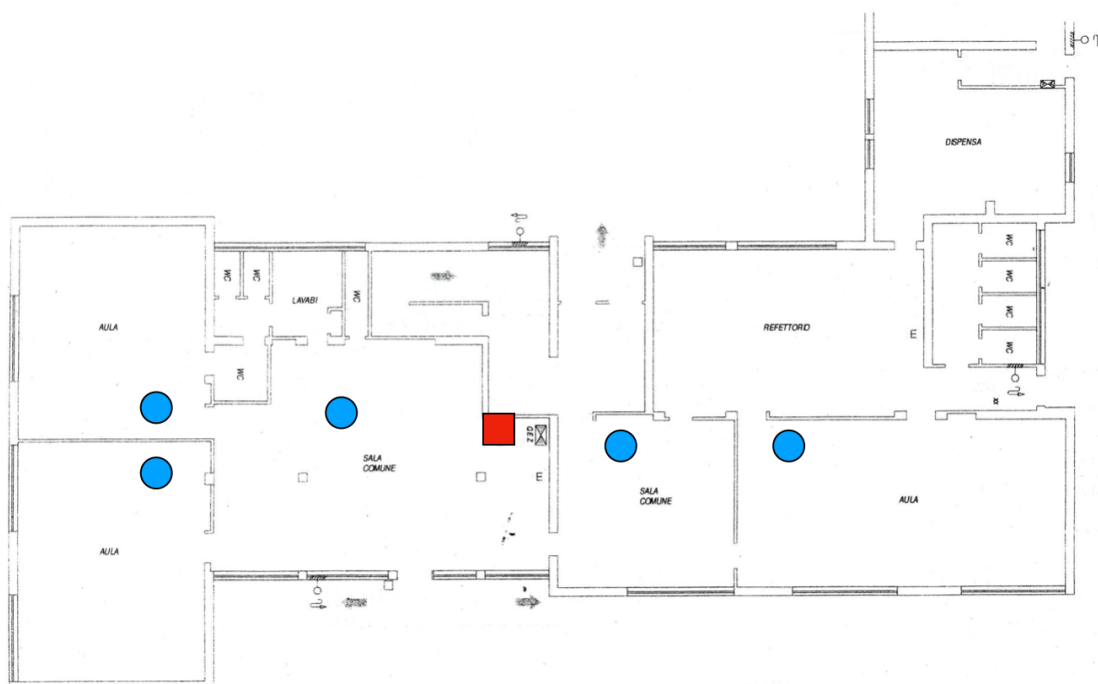

INFANZIA BARTOLINI

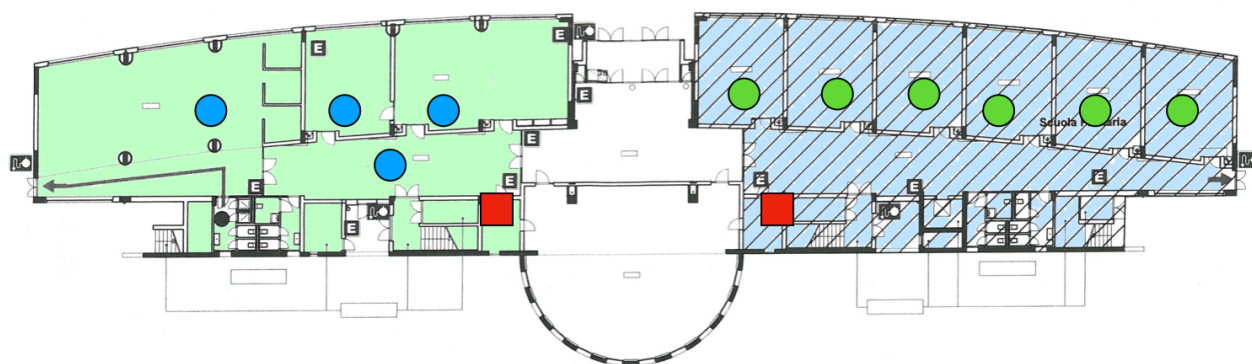


Piano Terra

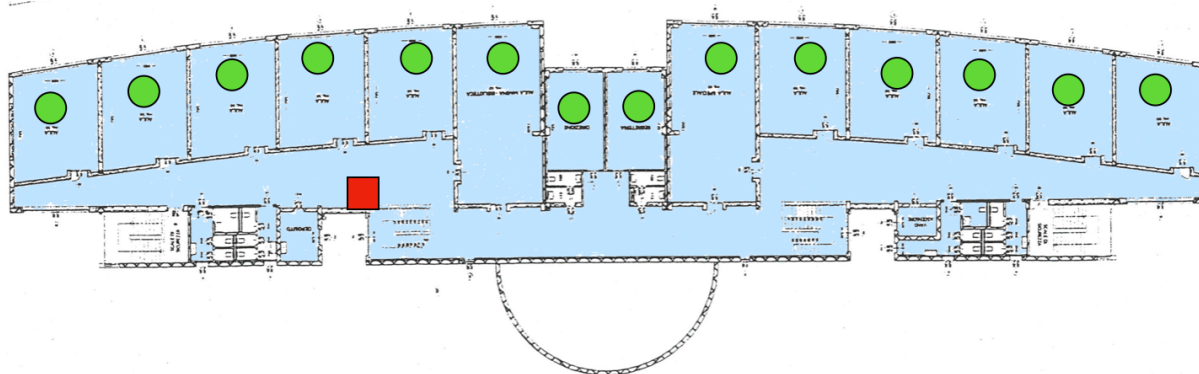


PRIMARIA DON BOSCO


INFANZIA COLLODI

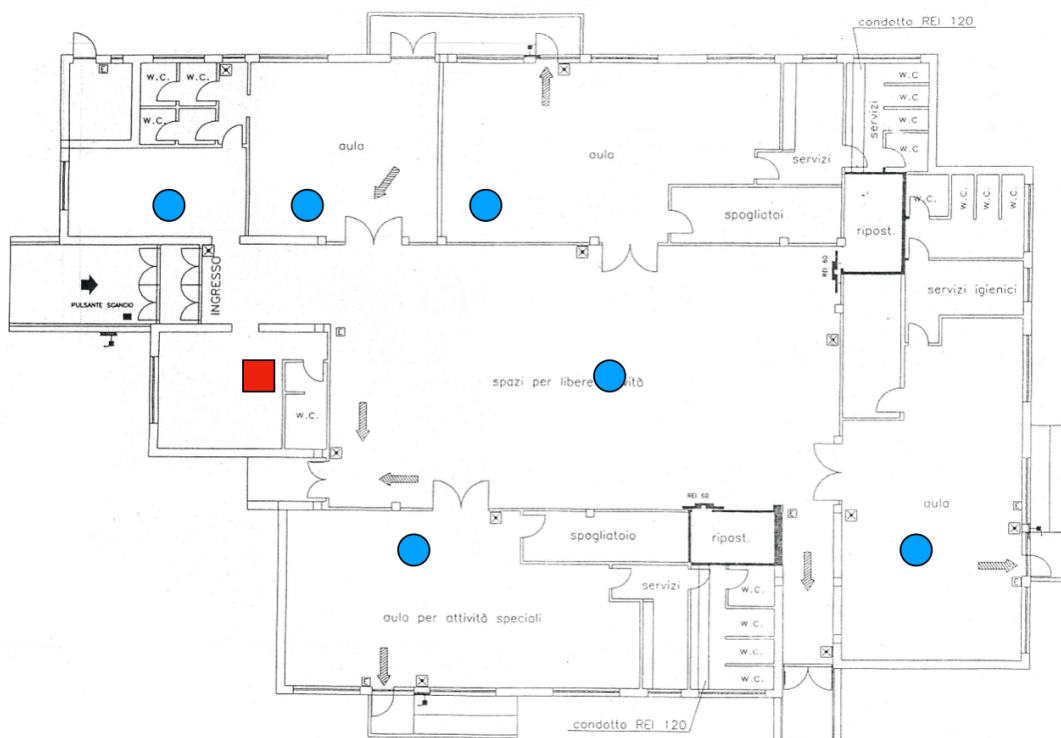

PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

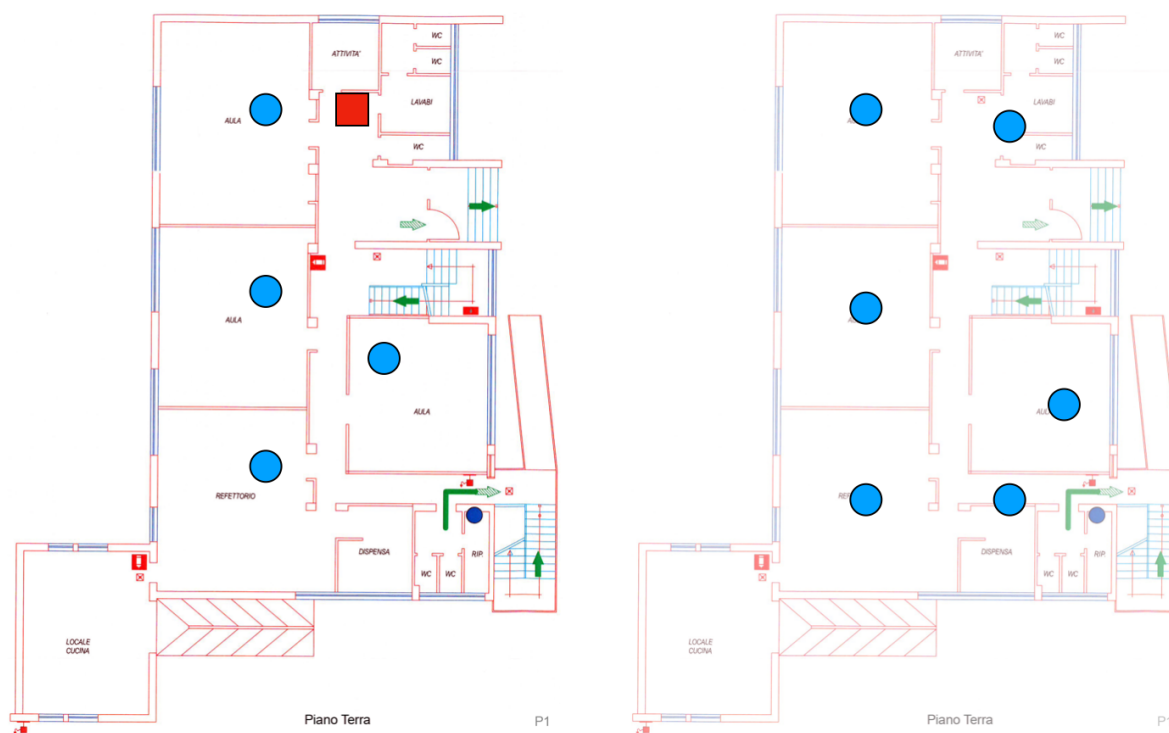

INFANZIA G. RODARI

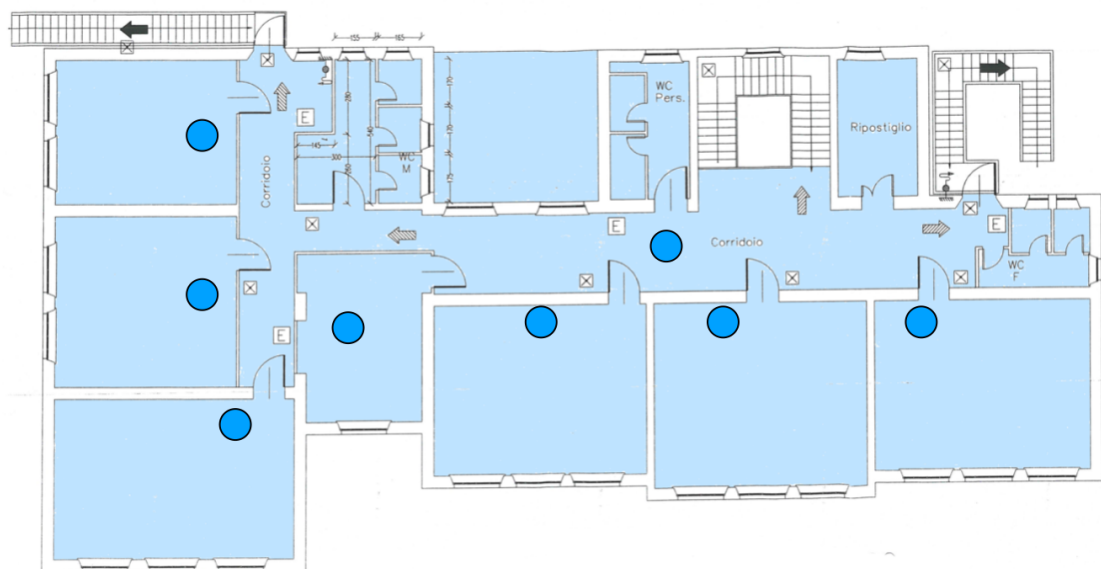

PRIMARIA D. MILANI
