ISC Borgo Solestà – Cantalamessa di Ascoli Piceno
con corso ad indirizzo musicale
Via S. Serafino da Montegranaro, 1 – tel. 0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

www.iscsolecanta.gov.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Progetto finalizzato all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON: 10.8.1.A1 FESRPON -MA-2015-64
Titolo modulo "Realizzazione rete LAN ISC Borgo Solesta'-Cantalamessa"

Codice CUP: D36J15002030007

Codice CIG: ZA219456F7

Prot. n. 7213 /B15i del 1/XII/'16

Agli Atti
Al Sito web della Scuola
All'ALBO

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA- 2015-64
"Realizzazione rete LAN ISC Borgo Solesta'-Cantalamessa"

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il Gruppo di lavoro costituito da:

Prof.ssa Irene Laurenzi Collaudatore nominato con atto dirigenziale prot. n. 2684/B15 del 28/04/2016, a seguito di Avviso di selezione personale interno

Sig. Marco Leli Rappresentante della Ditta ELETTRICA MACERATESE per Telecom Italia S.p.a. –

si è riunito presso la sede dell'ISC Borgo Solestà-Cantalamessa, via S. Serafino da Montegranaro, 1 per la redazione del verbale di collaudo relativo alla fornitura dell'ordine diretto Consip – Convenzione reti locali 5 2946077 prot. 3101/B15 del 17/05/2016 Registro Contratti di seguito dettagliata:

Fornitura	Quantità	Prezzo unitario IVA 22% esclusa €	Prezzo totale IVA 22% esclusa €
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	2240 m	0,35	854,00
Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	2240 m	0,45	1098,00
Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole	14	5,39	75,46
Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole	14	19,26	269,64
Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	4	74,24	296,96
Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	4	13,76	55,04
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m	28	3,43	96,04
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 2m	28	3,78	105,84
Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	4	191,40	765,60
Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	4	5,53	22,12
Fornitura in opera Ripiano fisso	1	15,61	15,61
Fornitura in opera Access Point per ambienti interni 14 Pezzo 149,37 2091,18	14	149,37	2091,18
Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni	14	16,44	230,16
Fornitura in opera Sistema di gestione degli access point	1	514,90	514,90
Configurazione sistema di gestione degli access point	1	56,64	56,64
Fornitura in opera Switch tipo 2	4	308,70	1234,80
Configurazione Switch tipo 2	4	9,26	37,04
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali	1	3142,97	3142,97
Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi	1	1649,85	1649,85
Totale complessivo fornitura (al netto di IVA)			12611,85

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue:

1) La fornitura di materiale corrisponde a quanto richiesto con ordine n. 2946077 del 17/05/2016 su Consip: Convenzione Reti locali 5;

2) Il materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed è esente da ogni difetto che possa pregiudicare l'utilizzo;
3) Non è stato possibile fare prove di connessione in quanto le sedi oggetto dell'intervento erano prive di connessione ADSL. La Ditta Elettrica maceratese si impegna ad intervenire qualora, in sede di fornitura della linea vi siano difetti di funzionamento della connessione;
4) Accettazione del periodo di garanzia per le suddette apparecchiature nuove di fabbrica, di mesi dodici dalla data di collaudo;
5) Tutta la fornitura prevista dal contratto di compravendita tra l'ISC Borgo Solestà – Cantalamessa con sede in Ascoli Piceno (AP) e la ditta Telecom Italia spa di Milano (MI) è stata consegnata
6) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Pertanto tutto ciò premesso i sottoscritti, dopo le necessarie verifiche,

dichiarano

di aver proceduto alla verifica dell'installazione, messa in opera e funzionamento delle attrezzature consegnate, corrispondenti all'ordine Consip n. 2946077 – Convenzione reti locali 5 prot. 3101/B15 del 17/05/2016 - verifica conclusasi con esito positivo.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COLLAUDATORE Prof.ssa Irene Laurenzi

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Sig. Marco Leli
ELETTRICA MACERATESE DI Franchi & c srl per Telecom Italia S.p.a

Elettrica Maceratese
di Franchi & C. srl
Via P. Coppi, 10/21
62100 Macerata
C.F. e P.IVA 01159070430

I beni sono stati assunti in inventario ai sensi dell'art. 24 e 25 del Decreto Interministeriale 44 del 01/02/2001 e ad essi sono stati assegnati i seguenti numeri dell'inventario - beni mobili - Categoria III – Hardware e supporti audiovisivi:

Descrizione del materiale	Q.tà	Ubicazione
Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	01	Scuola Rodari
Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	01	Scuola Collodi
Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	01	Scuola Ciotti
Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	01	Scuola Latini
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Rodari
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Rodari
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Rodari
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Rodari
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Collodi
Access Point per ambienti interni	01	Scuola Collodi

Marca Huawei – modello AP5130DN		
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Collodi
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Ciotti
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Ciotti
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Ciotti
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Latini
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Latini
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Latini
Access Point per ambienti interni Marca Huawei – modello AP5130DN	01	Scuola Latini
Switch tipo 2 Marca Huawei /S2750-28TP-PWR-EI-AC	01	Scuola Rodari
Switch tipo 2 Marca Huawei /S2750-28TP-PWR-EI-AC	01	Scuola Collodi
Switch tipo 2 Marca Huawei /S2750-28TP-PWR-EI-AC	01	Scuola Ciotti
Switch tipo 2 Marca Huawei /S2750-28TP-PWR-EI-AC	01	Scuola Latini

Dalla piantina in allegato si evince il posizionamento degli AP e degli armadi per ciascuna sede.

Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo:


IL D.S.G.A. DI SILVERIO FRANCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO GIORGI SILVIA


RODARI - Via S. SERAFINO




COLLODI 51 VIA ROSSINI

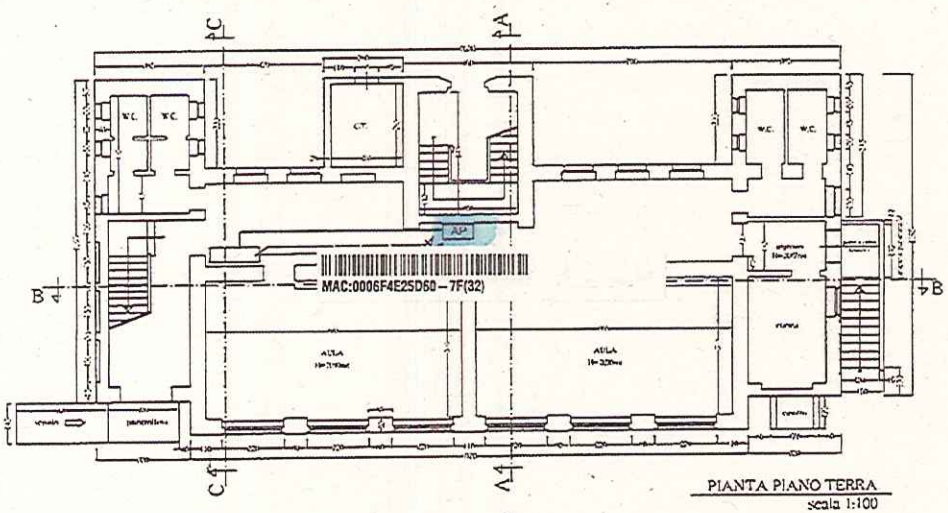


PIANTA PIANO TERRA
scala 1:100

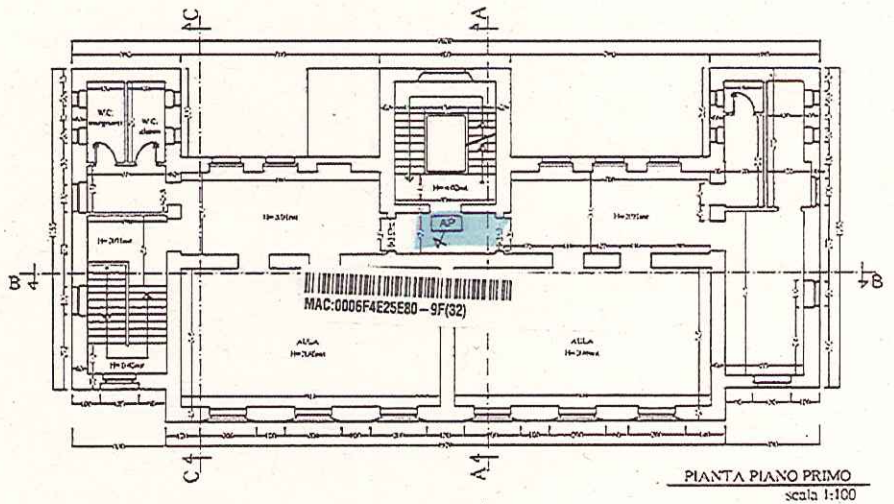

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1:100

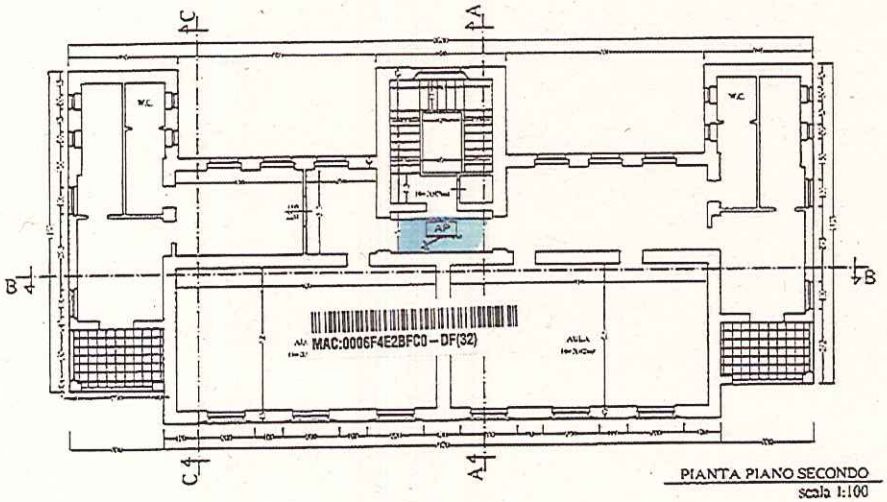


PIANTA PIANO SECONDO
scala 1:100

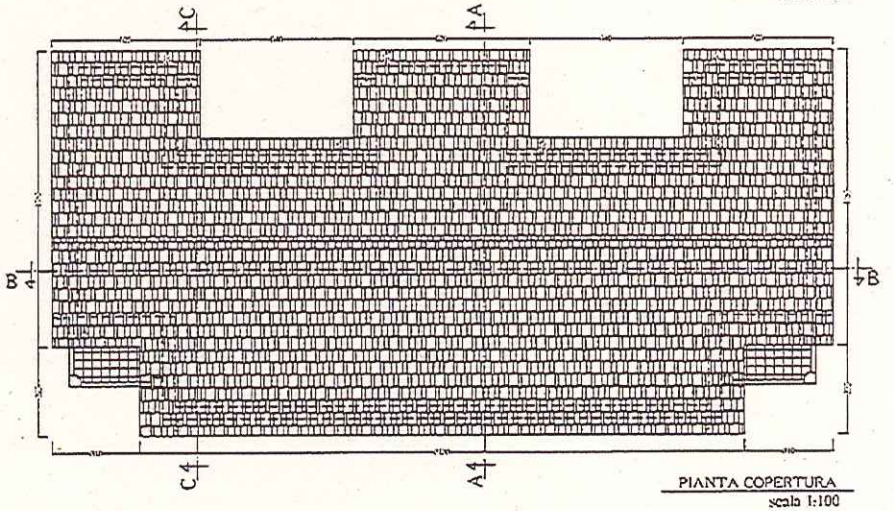


PIANTA COPERTURA
scala 1:100

F. CIOTTI - VENAGRANDE

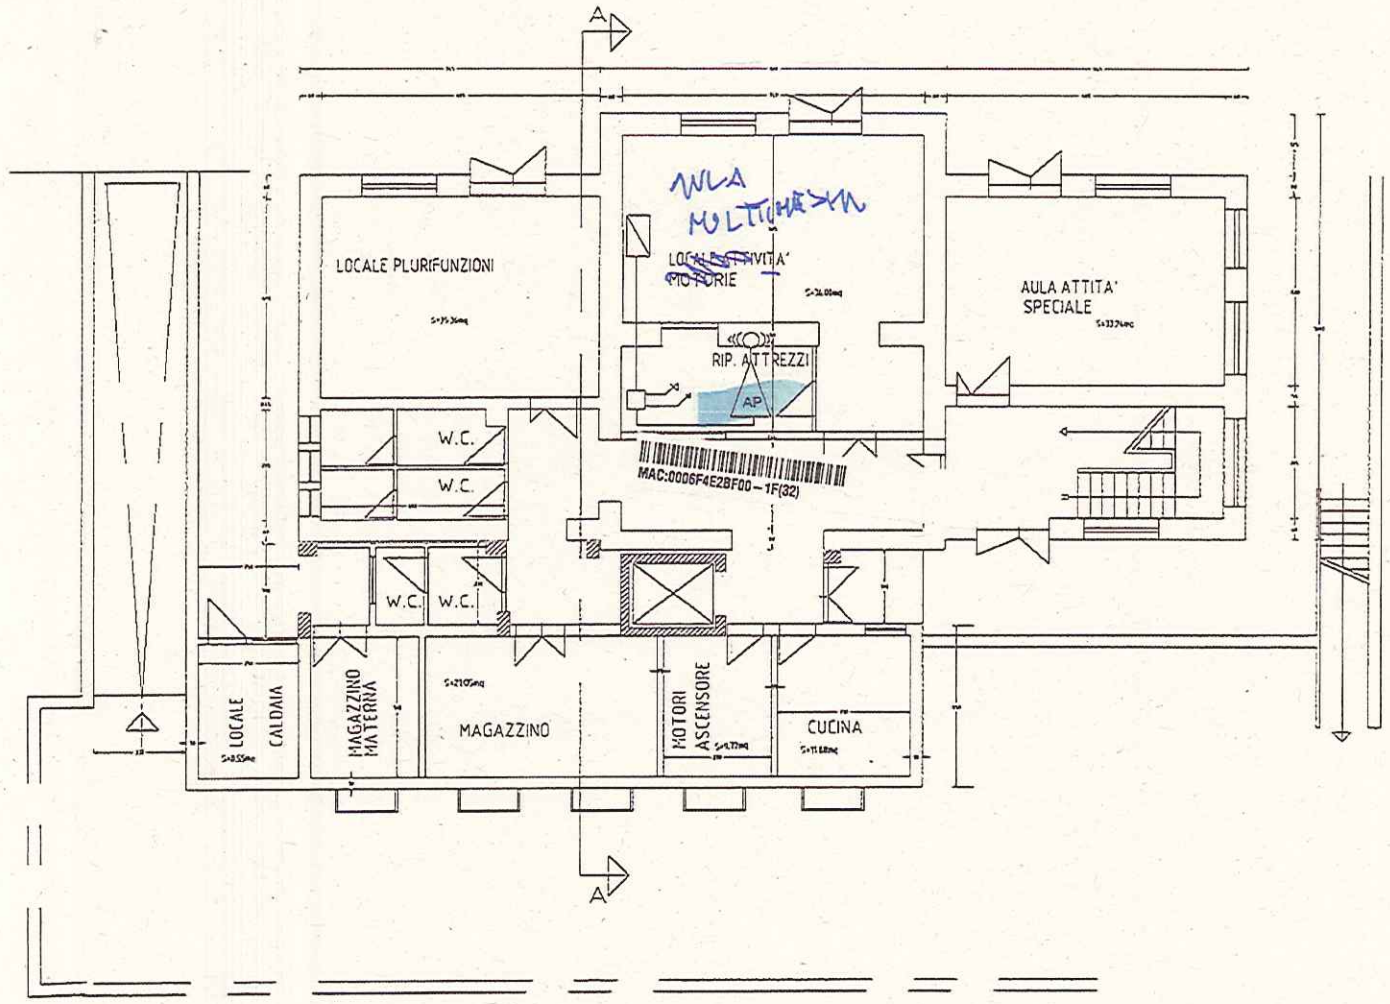


PIANO SEMINTERRATO

A. LATINI - BOZZANO

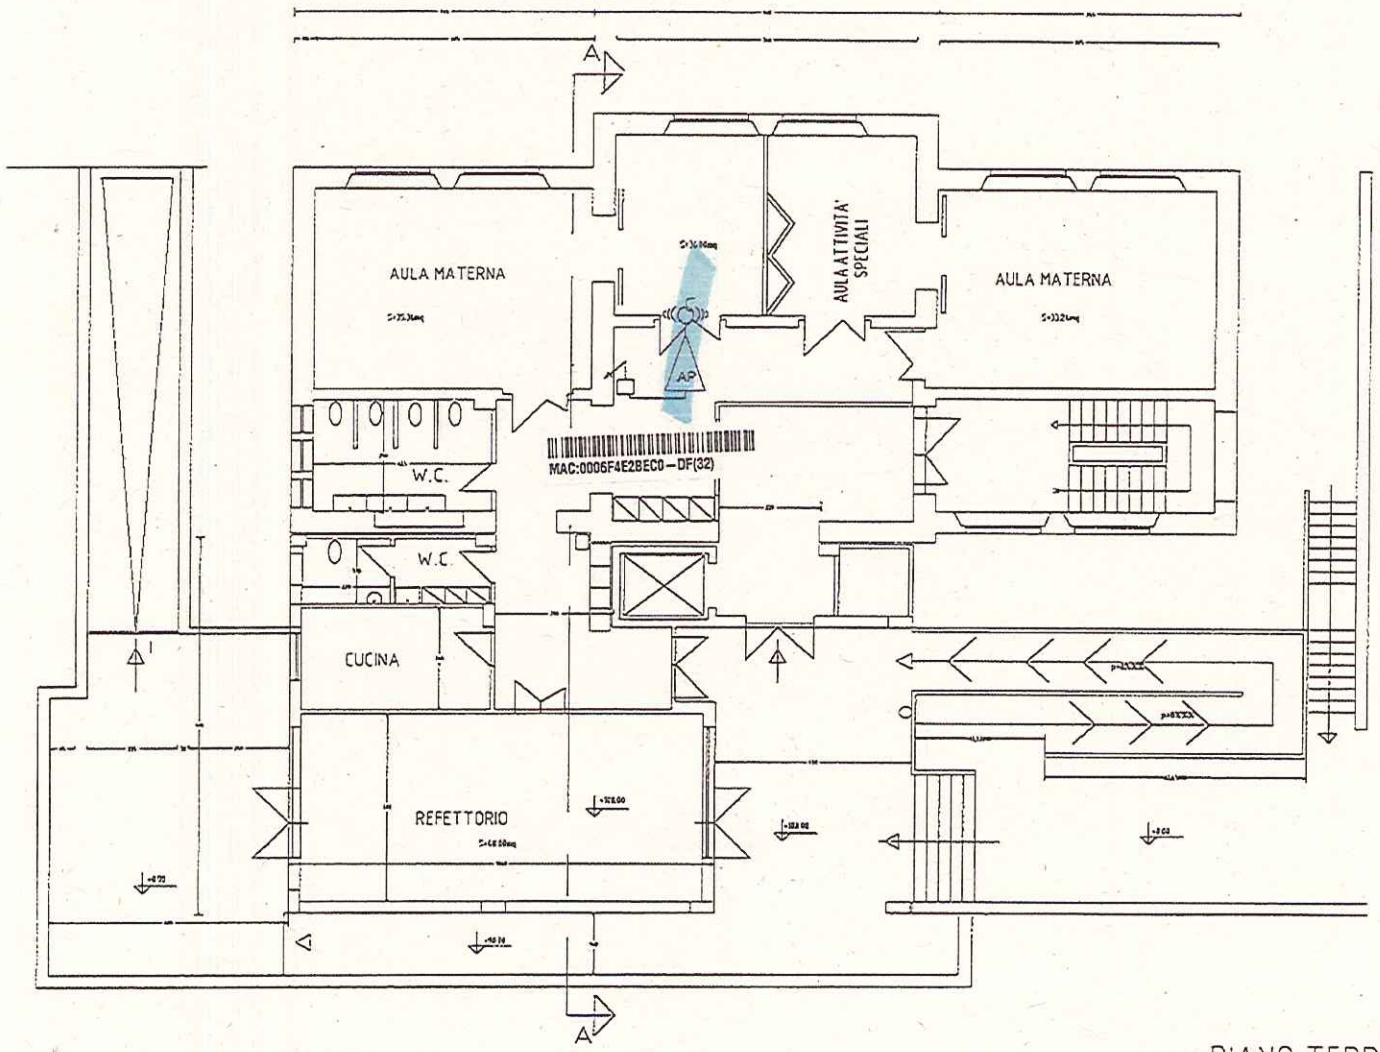

PIANO TERRA

A. LATINI - MOZZANO

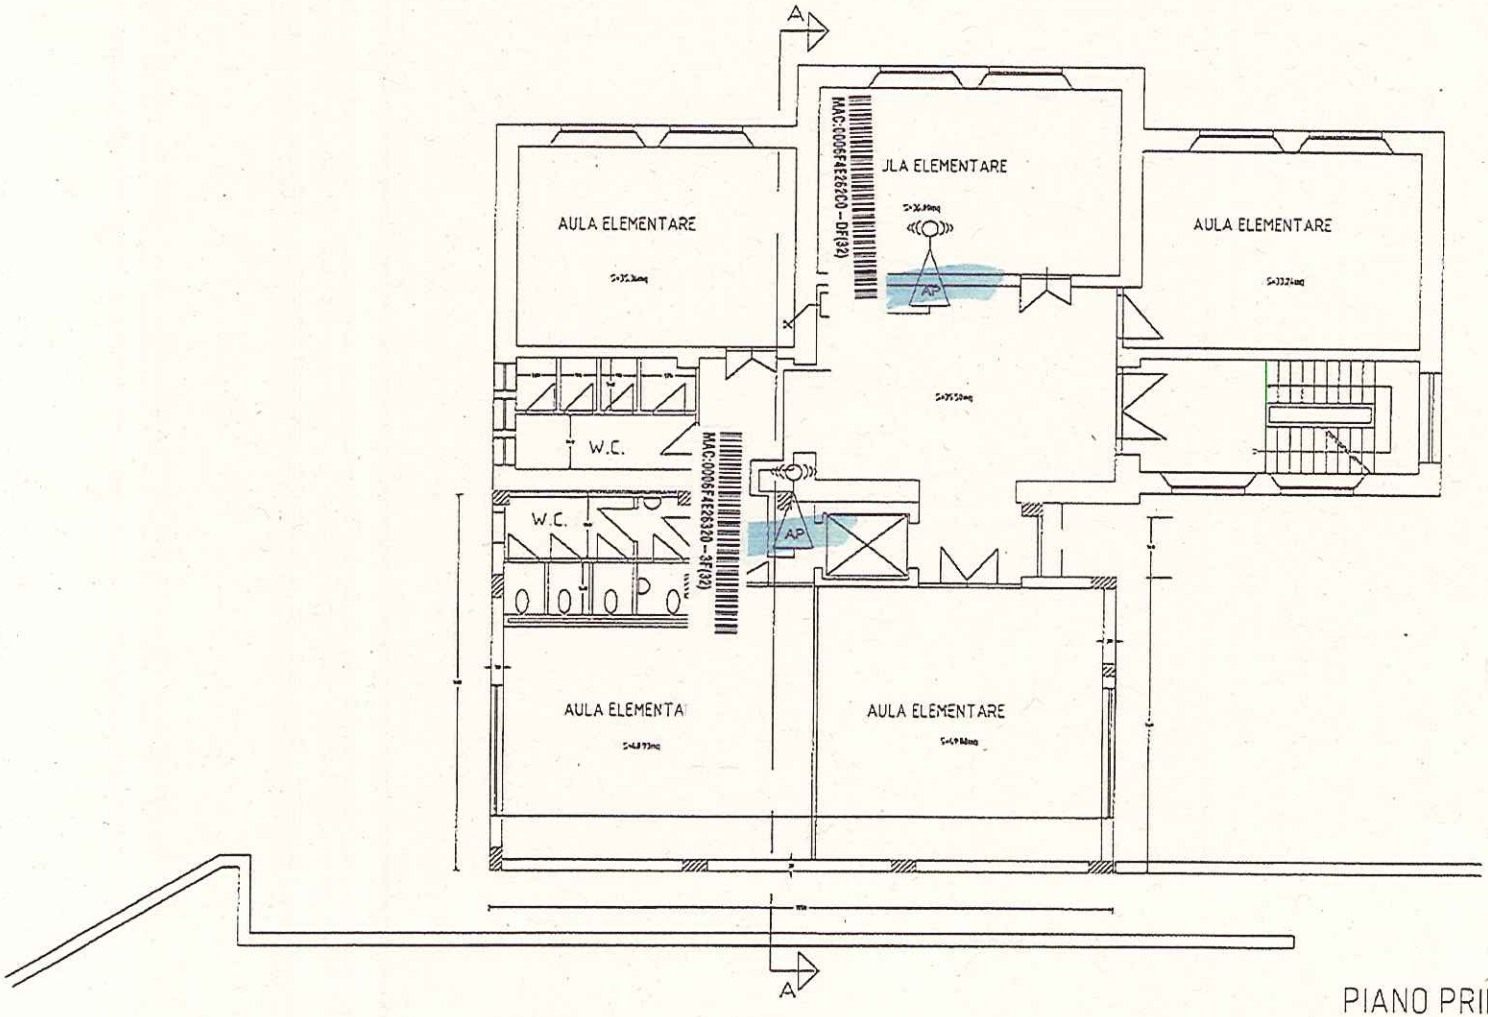

PIANO PRIMO

A. LAZZINI - MOZZANO
